Warkop Naik Kelas

Rencana lengkap membangun warkop ala Kuningan versi kekinian, mulai dari konsep, modal, keuangan, alat, sistem, sampai marketing.

Rp 50 jt	41 trx	Rp 9,4 jt	Bulan 8
Modal awal	Titik impas / hari	Laba / bulan (stabil)	Balik modal

SEKILAS

Warkop naik kelas dengan modal Rp 50 juta

Konsep warkop ala Kuningan (murah, cepat, buka sampai larut) dengan sentuhan kafe. Dimulai dari kios kecil, owner turun tangan langsung, dan setiap upgrade dibiayai dari laba.

MODAL TOTAL
Rp 50 jt
termasuk cadangan Rp 8,7 jt


TITIK IMPAS
41
transaksi per hari

LABA BERSIH STABIL
Rp 9,4 jt
per bulan, mulai bulan 7

BALIK MODAL
Bulan 8
skenario moderat


Ke mana modal dipakai

dalam juta rupiah

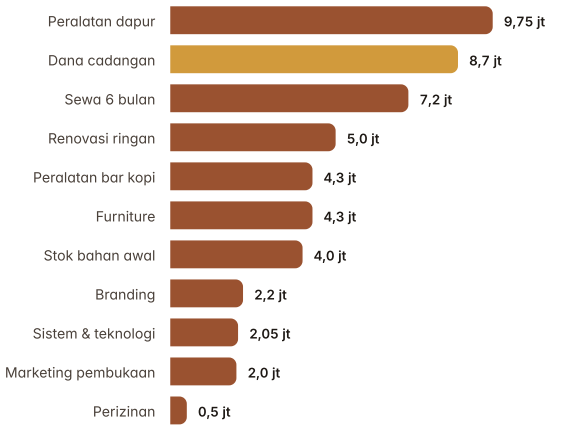

Proyeksi 12 bulan pertama

juta rupiah per bulan

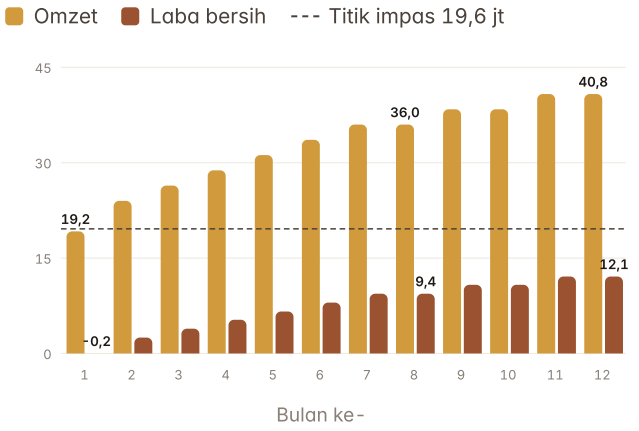

TAHAP 1 · BUKA
Kios 3×8 m, cold brew & moka pot, 20 kursi

TAHAP 2A · BULAN 4–6
Freezer, TV nobar, neon box

TAHAP 2B · BULAN 7–9
Mesin espresso + grinder

TAHAP 3 · TAHUN 2
Ruko lebih besar atau cabang ke-2

4 strategi kunci modal Rp 50 juta

1 **Tanpa mesin espresso dulu**
Kopi susu kekinian dari cold brew & moka pot. Espresso dibeli dari laba di bulan 7–9.

2 **Owner turun tangan**
Owner jadi kasir/barista jam ramai: hemat gaji, kualitas & uang terjaga.

3 **Fokus jam ramai**
Buka 10.00–01.00, bukan 24 jam. Jam pagi ditambah setelah stabil.

4 **Cadangan tak disentuh**
Rp 8,7 jt hanya untuk menutup kekurangan operasional & darurat.

ISI DOKUMEN

Daftar isi

00 **Ringkasan Eksekutif**
Gambaran utuh rencana dalam satu halaman.

01 **Konsep & Positioning**
Mempertahankan DNA warkop Kuningan, menaikkan pengalaman.

02 **Riset Pasar & Lokasi**
Keputusan paling mahal kalau salah. Validasi dengan data.

03 **Desain Tempat & Layout**
Kios kecil yang terasa rapi, terang, dan nyaman untuk lama.

04 **Menu, Harga & HPP**
Menu ringkas: penarik di harga murah, margin dari minuman.

05 **Peralatan & Naik Kelas Bertahap**
Alat secukupnya dulu, upgrade dibiayai dari laba.

06 **Modal Rp 50 Juta & Sumber Dana**
Ke mana setiap rupiah dari Rp 50 juta dialokasikan.

07 **Proyeksi Keuangan**
Asumsi, titik impas, skenario, dan proyeksi 12 bulan.

08 **Sistem Operasional & SOP**
Standar kerja harian supaya rasa dan uang konsisten.

09 **SDM: Struktur, Gaji & Training**
Tim ramping: owner turun tangan + 2 crew.

10 **Teknologi & Kontrol Keuangan**
Alat digital gratis dan aturan anti-kebocoran.

11 **Supplier & Rantai Pasok**
Bahan yang tepat, harga terjaga, stok tidak menumpuk.

12 **Marketing & Branding**
Konten organik, komunitas, dan mulut ke mulut.

13 **Legal & Perizinan**
Izin dan pajak yang perlu diurus.

14 **Manajemen Risiko**
Apa yang bisa salah dan cara mencegahnya.

15 **Timeline Eksekusi**
Langkah demi langkah dari H-60 sampai H+90.

16 **KPI & Dashboard**
Angka yang dipantau setiap minggu.

17 **Roadmap 3 Tahun**
Dari satu kios kecil ke konsep penuh.

18 **Checklist Sebelum Buka**
Pastikan semua siap sebelum pintu dibuka.

19 **Lampiran: Template Laporan**
Format laporan siap pakai.

00

Ringkasan Eksekutif

Gambaran utuh rencana dalam satu halaman.

ITEM	RINGKASAN
Konsep	Warkop ala Kuningan (murah, cepat, buka sampai larut, Indomie, kopi, nongkrong) + sentuhan kafe (kopi susu gula aren, kopi seduh beans lokal, tempat rapi, WiFi, colokan, QRIS, brand yang jelas).
Positioning	"Harga warkop, rasa & suasana kafe."
Target pasar	Ojol, pekerja, mahasiswa/pelajar, karyawan pulang kerja, anak muda 17–35 th, komunitas.
Ukuran tempat	Kios kecil ± 3 × 8 m + teras, 20 kursi.
Jam buka	10.00–01.00 (Jumat–Sabtu sampai 02.00). Jam pagi ditambah setelah stabil.
Tim	**Owner ikut kerja** (kasir/barista jam ramai) + 2 crew.
Modal	**Rp 50 juta** (sudah termasuk sewa 6 bulan dan dana cadangan Rp 8,7 juta).
Rata-rata transaksi	Rp 16.000 per nota.
Titik impas (BEP)	± **41 transaksi/hari** (omzet ± Rp 654 ribu/hari).
Target stabil (bulan 7+)	75 transaksi/hari → omzet ± Rp 36 juta/bulan, laba bersih ± **Rp 9,4 juta/bulan** (sudah termasuk penghasilan owner).
Balik modal	± **bulan ke-8** (skenario moderat dengan masa ramp-up).

Strategi kunci untuk modal Rp 50 juta:

1. **Tanpa mesin espresso dulu.** Kopi susu kekinian dibuat dari **cold brew & moka pot** (rasa tetap enak, alat murah). Mesin espresso dibeli dari laba di bulan 7–9.
2. **Owner turun tangan langsung**: menghemat 1–2 gaji dan sekaligus menjaga kualitas serta uang.
3. **Fokus jam ramai** (siang–tengah malam), bukan 24 jam.
4. **Dana cadangan tidak boleh disentuh** untuk belanja alat.

3 kunci sukses:

1. **Lokasi** dengan lalu lintas orang tinggi di jam sore–malam.
2. **Konsistensi rasa & kecepatan** (Indomie ≤ 7 menit, kopi ≤ 3 menit).
3. **Kontrol uang & stok yang disiplin** (POS, stok opname, rekening terpisah).

01

Konsep & Positioning

Mempertahankan DNA warkop Kuningan, menaikkan pengalaman.

1.1 DNA Warkop Kuningan yang WAJIB dipertahankan

- Harga ramah kantong (ada menu "pancingan" Rp 5.000).
- Indomie sebagai "raja menu", diracik cepat dengan pilihan topping.
- Buka sampai larut: jadi tempat singgah semua kalangan.
- Suasana santai, egaliter: siapa saja boleh nongkrong lama.
- Pelayanan akrab, crew hafal pelanggan tetap.

1.2 Yang di-*LEVEL UP* (tetap bisa dengan modal Rp 50 juta)

ASPEK	WARKOP BIASA	WARKOP NAIK KELAS
Kopi	Sachet saja	Sachet **+ kopi susu gula aren (cold brew)** + kopi seduh V60 beans lokal. Espresso menyusul di Tahap 2.
Tempat	Seadanya, gelap	Bersih, terang, cat 2 warna brand, 1 dinding mural/tulisan sebagai spot foto
Fasilitas	Kadang WiFi	WiFi stabil, colokan di meja bar, wastafel
Pembayaran	Tunai	Tunai + **QRIS**
Pencatatan	Buku tulis / tidak ada	**Aplikasi POS di HP** (versi gratis), laporan harian
Brand	Tanpa logo	Logo, warna, apron, stiker logo di cup, akun IG/TikTok
Penjualan	Dine-in saja	Dine-in + takeaway + GoFood/GrabFood/ShopeeFood
Pelanggan	Tidak tercatat	Kartu stamp, grup/broadcast WA, event komunitas sederhana
Menu	Itu-itu saja	Menu inti + **menu signature** + menu musiman tiap 2–3 bulan

1.3 Target Pasar (Persona)

PERSONA	KEBUTUHAN	JAM RAMAI	MENU FAVORIT
Ojol & pekerja lapangan	Murah, cepat, tempat istirahat, colokan	11.00–14.00, 20.00–24.00	Kopi sachet, Indomie telur, nasi telor
Karyawan pulang kerja	Melepas penat, nongkrong	17.00–22.00	Es kopi susu aren, roti bakar, mie special
Mahasiswa / pelajar	WiFi, tempat ngerjain tugas, murah	14.00–23.00	Es teh jumbo, kopi susu, pisang bakar
Pekerja shift / begadang	Buka larut, makanan hangat	22.00–01.00	Mie rebus, susu jahe, nasi goreng

PERSONA	KEBUTUHAN	JAM RAMAI	MENU FAVORIT
Komunitas (bola, game, motor)	Ruang kumpul	Malam akhir pekan	Paket rombongan

1.4 Value Proposition (USP)

1. **"Harga warkop, rasa kafe"**: es kopi susu gula aren Rp 13 rb (kafe Rp 25–35 rb).
2. **Indomie racikan signature** dengan level pedas & topping kekinian.
3. **Nyaman buat lama**: WiFi, colokan, buka sampai jam 1–2 pagi.
4. **Cepat**: standar penyajian terukur.

1.5 Nama Brand & Identitas

Opsi nama (cek dulu ketersediaan di PDKI/DJKI dan nama akun IG/TikTok):

- **Warkop Naik Kelas**: jelas, mudah diingat, menggambarkan konsep.
- **Ngopi Dulu Bang**: akrab, cocok untuk ojol & anak muda.
- **Warkop Prapatan**: cocok kalau lokasi di perempatan.
- **Kopi Lampu Jalan**: identik dengan nongkrong malam.
- **Warkop Sabi**: slang anak muda, singkat.

Identitas visual yang disarankan:

- Warna: cokelat kopi `#5B3A29`, krem `#F3E9DC`, aksen kuning lampu `#F2B705`.
- Font: tebal & bulat untuk judul, sans-serif sederhana untuk menu.
- Logo bisa dibuat sendiri di **Canva** atau freelancer murah (± Rp 300 rb).
- Tagline opsi: *"Nongkrong Naik Kelas"*, *"Murahnya Warkop, Enaknya Kafe"*, *"Buka Sampai Ngantuk"*.

Daftarkan merek di DJKI (merek.dgip.go.id) setelah usaha jalan dan nama terbukti cocok (tahap 2). Ada tarif khusus UMKM; cek tarif terbaru.

02

Riset Pasar & Lokasi

Keputusan paling mahal kalau salah. Validasi dengan data.

> Dengan modal terbatas, **lokasi adalah keputusan paling mahal kalau salah**. Lebih baik kios kecil di lokasi ramai daripada kios besar di lokasi sepi.

2.1 Kriteria Lokasi Ideal

- Di **jalan utama atau jalan kolektor** yang ramai motor, bukan gang buntu.
- Dekat **generator keramaian**: kampus, SMA/SMK, kawasan pabrik, perumahan padat, kos-kosan, pangkalan ojol, RS, minimarket 24 jam, SPBU.
- **Mudah parkir motor** (minimal 8–10 motor).
- Terlihat dari 2 arah jalan.
- Lingkungan menerima usaha buka malam (minta izin RT/RW sejak awal).
- Listrik minimal 2.200 VA, air lancar, ada saluran pembuangan.
- **Sewa ≤ Rp 1,5 juta/bulan** (± 4% dari target omzet).

2.2 Cara Validasi Lokasi (wajib, jangan pakai feeling)

1. **Hitung lalu lintas**: duduk di depan lokasi 3 hari (1 hari kerja, Jumat, Sabtu), catat jumlah orang/motor yang lewat setiap jam pada 11–14, 17–22, 22–01.
2. **Survei kompetitor** dalam radius 1 km: harga, jam ramai, berapa meja terisi, apa kelemahannya (kotor? lambat? tidak ada QRIS?).
3. **Wawancara 30 orang** calon pelanggan: biasa nongkrong di mana, habis berapa, mau apa yang belum ada.
4. **Cek riwayat tempat**: kenapa penyewa sebelumnya tutup?
5. **Cek aturan**: rawan penertiban? ada rencana pelebaran jalan?

2.3 Skor Lokasi (pilih yang skor ≥ 75)

KRITERIA	BOBOT	SKOR 1–5	NILAI (BOBOT × SKOR ÷ 5)
Lalu lintas orang sore–malam	25		
Kedekatan generator keramaian	20		
Parkir motor	15		
Visibilitas	10		
Harga sewa vs potensi	10		
Kompetisi (makin sedikit yang bagus, makin tinggi skor)	10		
Infrastruktur (listrik, air, saluran)	5		

KRITERIA	BOBOT	SKOR 1–5	NILAI (BOBOT × SKOR ÷ 5)
Penerimaan lingkungan	5		
Total	**100**		

2.4 Negosiasi Sewa (penting untuk modal Rp 50 juta)

- Target: **bayar per 6 bulan** (Rp 7,2 juta), bukan langsung 1–2 tahun. Tawarkan bukti keseriusan (renovasi rapi, kontrak tertulis).
- Jika pemilik **wajib bayar 1 tahun** (Rp 14,4 juta): kurangi biaya lain (lihat bab 6.3), jangan pakai dana cadangan.
- Minta **masa renovasi gratis 2–4 minggu**.
- Minta **hak perpanjangan** dengan kenaikan maksimal 10%, supaya tidak "diusir" setelah ramai.
- Pastikan dalam kontrak: boleh renovasi ringan, pasang papan nama, buka malam; siapa yang menanggung perbaikan besar.
- Kontrak tertulis + materai + fotokopi bukti kepemilikan pemilik.

03

Desain Tempat & Layout

Kios kecil yang terasa rapi, terang, dan nyaman untuk lama.

3.1 Zonasi (kios 3 × 8 m + teras)

JALAN RAYA

Parkir motor
8–10 motor

Teras
2 meja · 8 kursi · area merokok, paling ramai malam · papan nama + lampu

rolling door, dibuka penuh

Bar & kasir
di depan, terlihat dari jalan · HP POS · moka pot & cold brew

Area duduk dalam
2 meja · 8 kursi · meja bar dinding + colokan, 4 stool

Dapur
kompor, plat pemanggang, kulkas, cuci piring

Kios ± 3 × 8 m + teras · toilet memakai fasilitas kios/ruko jika ada

3.2 Prinsip Desain Hemat tapi Naik Kelas

- **Bar di depan**: aroma kopi jadi magnet, kasir bisa melihat seluruh area.
- **Cat 2 warna brand** (misal krem + cokelat) sudah membuat tempat terlihat "beda" dari warkop biasa.
- **1 dinding spot foto**: tulisan tagline dengan cat/stiker vinyl atau papan kayu, ini yang membuat orang posting gratis.
- **Lampu LED putih hangat** (3000–4000K); tempat terang = terlihat bersih & aman.
- **Meja bar dinding + colokan** untuk ojol & mahasiswa (paling dicari).
- Furniture **kayu/besi hollow buatan tukang lokal**: lebih murah & awet.
- **Keamanan**: instalasi listrik rapi, stop kontak pelanggan tidak di dekat air, APAR di dekat dapur.
- Kipas angin dinding + exhaust/ventilasi di dapur.

04

Menu, Harga & HPP

Menu ringkas: penarik di harga murah, margin dari minuman.

4.1 Struktur Menu (17 item, cukup & cepat)

Prinsip: menu murah sebagai penarik, menu signature sebagai penghasil margin. Menu sedikit = stok sedikit = modal tidak "tidur".

MINUMAN

MENU	HARGA	BIAYA BAHAN*	HPP %	PERAN
Kopi hitam sachet / tubruk	5.000	2.300	46%	Penarik
Kopi susu sachet (panas/es)	6.000	2.800	47%	Penarik
Kopi Susu Warkop (cold brew + SKM)	10.000	4.500	45%	Bintang
Es Kopi Susu Gula Aren (cold brew)	13.000	6.000	46%	Bintang
Kopi seduh V60 beans lokal	12.000	3.500	29%	Citra "naik kelas", margin tinggi
Es teh manis jumbo	5.000	2.000	40%	Penarik
Es jeruk	8.000	3.500	44%	Pendamping
Susu jahe / wedang jahe	8.000	3.000	38%	Menu malam

MAKANAN & CAMILAN

MENU	HARGA	BIAYA BAHAN*	HPP %	PERAN
Indomie rebus/goreng polos	8.000	4.500	56%	Penarik
Indomie + telur	12.000	6.900	57%	Terlaris
Indomie Special (telur, kornet, keju)	18.000	9.500	53%	Signature
Mie nyemek level pedas	14.000	7.000	50%	Signature
Nasi telor + sambal + kerupuk	10.000	4.500	45%	Penarik
Nasi goreng warkop	15.000	7.000	47%	Malam
Roti bakar coklat keju	13.000	5.500	42%	Bintang
Pisang bakar coklat	10.000	4.500	45%	Pendamping
Gorengan **titip jual** (per biji)	2.000	1.400	70%	Penarik, tanpa risiko sisa

*Biaya bahan sudah termasuk cup/kemasan untuk takeaway; untuk dine-in pakai gelas/piring sendiri sehingga HPP minuman lebih rendah 5–10 poin.

Menu Tahap 2 (setelah ada mesin espresso & freezer): americano, kopi susu espresso, kentang goreng, sosis bakar, rice bowl.

4.2 Paket (menaikkan nilai transaksi)

PAKET	ISI	HARGA	HEMAT
Paket Ojol	Indomie telur + kopi sachet	15.000	2.000
Paket Begadang	Mie nyemek + susu jahe	20.000	2.000
Paket Nongkrong (2 orang)	2 es kopi susu aren + roti bakar	35.000	4.000
Paket Rombongan (4 orang)	4 Indomie telur + 4 es teh jumbo	60.000	8.000

4.3 Aturan Harga & HPP

- **Target HPP gabungan 38–42%.** Model keuangan memakai 42% (konservatif). Setiap turun 1% HPP = tambahan laba ± Rp 360 rb/bulan di skenario moderat.
- Makanan HPP-nya tinggi (Indomie 53–57%), jadi **margin datang dari minuman**. Selalu tawarkan minuman: *"Minumnya sekalian, Kak? Es kopi susu aren lagi favorit."*
- Rumus harga jual: **Harga = Biaya bahan ÷ target HPP%**, lalu bulatkan ke Rp 1.000 terdekat.
- **Hitung ulang HPP tiap bulan** (telur, cabai, gula, susu sering naik). Kalau HPP item > 60%, naikkan harga atau ganti resep.
- **Menu engineering tiap 3 bulan** (data dari POS):
- Laris + margin tinggi → **Bintang**: taruh paling atas, tonjolkan.
- Laris + margin rendah → **Kuda**: naikkan harga sedikit / atur porsi topping.
- Tidak laris + margin tinggi → **Teka-teki**: promosikan, ganti nama/foto.
- Tidak laris + margin rendah → **Anjing**: hapus.

4.4 Standar Resep (contoh)

Konsentrat Cold Brew (dibuat malam, untuk ± 25 gelas)

1. Kopi blend robusta-arabika 500 g, giling kasar.
2. Rendam dengan 4 liter air matang suhu ruang dalam toples kaca, aduk.
3. Tutup, simpan di kulkas 12–16 jam.
4. Saring 2 kali (saringan + kain/kertas filter), simpan di botol berlabel tanggal. Tahan 5–7 hari di kulkas.

Es Kopi Susu Gula Aren (cup 14 oz)

1. Cup isi es batu penuh.
2. Gula aren cair 20 ml.
3. Susu UHT 80 ml + 15 ml krimer/SKM.
4. Konsentrat cold brew 60 ml dituang terakhir (efek layer).
5. Tutup, stiker, sedotan. Waktu saji ≤ 2 menit.

> Untuk kopi susu **panas**, pakai **moka pot** (1 moka 6 cup = ± 4 gelas). Panaskan susu di panci kecil.

Indomie Special

1. Rebus air 400 ml mendidih, masak mie 2,5 menit (goreng) / 3 menit (rebus).

2. Telur ceplok setengah matang (goreng) atau dicemplung (rebus).
3. Topping: kornet 1 sdm, keju parut 8 g, sawi, cabai rawit sesuai level (0–5), bawang goreng.
4. Sajikan di mangkok, waktu ≤ 7 menit.

> Buat **kartu resep** untuk setiap menu (takaran gram/ml, urutan, foto hasil akhir), tempel di bar & dapur.

4.5 Menu Musiman (setiap 2–3 bulan, tanpa alat baru)

Contoh: kopi pandan, kopi susu kelapa, es kopi butterscotch (sirup), Indomie seblak, Indomie rendang, wedang uwuh saat musim hujan. Menu musiman = bahan konten & alasan pelanggan datang lagi.

05

Peralatan & Naik Kelas Bertahap

Alat secukupnya dulu, upgrade dibiayai dari laba.

5.1 Daftar Alat Tahap 1 (modal awal)

KATEGORI	ITEM	ESTIMASI HARGA
Bar Kopi	Moka pot 6 cup × 2	700.000
	Grinder kopi elektrik (burr)	1.000.000
	Set cold brew (toples kaca + filter)	300.000
	Set manual brew: V60, kettle, timbangan digital	500.000
	Blender	800.000
	Water boiler 10 L (air panas kopi sachet & teh)	1.000.000
Dapur	Kompor 2 tungku + selang & regulator	800.000
	Tabung LPG 12 kg + isi × 2	1.800.000
	Plat pemanggang roti bakar (di atas kompor)	500.000
	Wajan & alat gorengan	400.000
	Rice cooker 5 L	450.000
	Kulkas showcase 1 pintu	3.800.000
	Cool box es batu × 2 (pengganti freezer)	500.000
	Peralatan masak: panci, wajan, saringan, pisau, talenan	800.000
	Peralatan saji 40 set: mangkok, gelas, piring, sendok	700.000
Furniture	4 meja	1.600.000
	16 kursi/bangku	1.600.000
	Meja bar dinding + 4 stool	800.000
	Rak penyimpanan	300.000
Sistem	Printer struk thermal bluetooth (POS pakai HP owner)	400.000
	CCTV WiFi × 2 (dipantau dari HP)	700.000
	Pemasangan internet / WiFi	300.000
	Speaker bluetooth	300.000
	APAR 3 kg	350.000

5.2 Tips Hemat Modal tanpa Turun Kualitas

- **Kulkas showcase**: beli baru jika mampu (garansi kompresor, hemat listrik). Kalau bekas, cek dingin selama 1 jam & suara kompresor.
- **Furniture, counter, rak**: pesan ke tukang las/kayu lokal, atau beli bekas kafe yang tutup (cek marketplace & grup FB jual-beli lokal).
- **Peralatan saji**: beli di grosir alat dapur, bukan toko retail.
- **Renovasi DIY**: cat & mural dikerjakan sendiri bersama teman. Upah tukang hanya untuk listrik & plumbing (**jangan DIY instalasi listrik**).
- **Gorengan titip jual**: tidak perlu modal bahan & tenaga, bagi hasil Rp 500–700/biji.
- **Es batu kristal beli harian** daripada freezer.
- **POS gratis di HP** yang sudah ada, bukan beli tablet.
- **Jangan beli alat yang belum dibutuhkan menu Tahap 1.**

5.3 Rencana Naik Kelas Bertahap (dibiayai dari laba)

TAHAP	KAPAN	UPGRADE	ESTIMASI BIAYA	DAMPAK
Tahap 1	Buka	Alat di atas	Rp 50 jt (modal)	Konsep inti berjalan
Tahap 2a	Bulan 4–6	Chest freezer, TV bekas 43" (nobar), neon box	± Rp 6 jt	Menu frozen, malam nobar, lebih terlihat malam hari
Tahap 2b	Bulan 7–9	**Mesin espresso 1 group + grinder espresso**	± Rp 13 jt	Menu espresso, rata-rata transaksi naik ke ± Rp 18–19 rb
Tahap 2c	Bulan 9–12	Tambah 1 crew, buka pagi (06.00), tambah 2 meja	± Rp 3 jt + gaji	Tangkap pasar sarapan & ojol pagi
Tahap 3	Tahun 2	Pindah/perluas ke ruko 4 × 10 m atau cabang ke-2	Rp 80–130 jt (laba + KUR)	Konsep penuh

> Aturan upgrade: **upgrade hanya jika** (1) 2 bulan berturut-turut di atas BEP, (2) dana cadangan tetap utuh, dan (3) uang sewa periode berikutnya sudah tersisih.

06

Modal Rp 50 Juta & Sumber Dana

Ke mana setiap rupiah dari Rp 50 juta dialokasikan.

6.1 Rincian Investasi Awal

KATEGORI	JUMLAH	%
A. Sewa kios 6 bulan di muka (Rp 1,2 jt/bulan)	7.200.000	14,4%
B. Renovasi ringan (cat & mural DIY, stop kontak & listrik, lampu, counter bar, wastafel)	5.000.000	10,0%
C. Peralatan bar kopi	4.300.000	8,6%
D. Peralatan dapur	9.750.000	19,5%
E. Furniture	4.300.000	8,6%
F. Sistem (printer, CCTV, WiFi, speaker, APAR)	2.050.000	4,1%
G. Branding (logo, papan nama, menu, apron, stiker)	2.200.000	4,4%
H. Perizinan & administrasi	500.000	1,0%
I. Stok bahan awal	4.000.000	8,0%
J. Marketing pra-launch & grand opening	2.000.000	4,0%
K. **Dana cadangan / modal kerja**	8.700.000	17,4%
TOTAL	**50.000.000**	**100%**

> **Dana cadangan Rp 8,7 juta adalah "pelampung".** Dipakai hanya untuk menutup kekurangan biaya operasional di bulan-bulan awal (bulan 1 diproyeksikan masih rugi tipis) atau keadaan darurat (alat rusak), bukan untuk belanja alat tambahan.

6.2 Jika Uangnya Benar-Benar Hanya Rp 50 Juta

- Jangan pakai **seluruh** Rp 50 juta untuk usaha kalau itu satu-satunya tabungan keluarga. Idealnya ada **dana hidup pribadi 3 bulan** di luar modal ini, karena di awal laba belum bisa diambil.
- Kalau tidak ada dana hidup terpisah: tetap jalankan, tapi **owner tidak mengambil uang usaha** sebelum bulan ke-3 dan hidup sehemat mungkin.

6.3 Jika Pemilik Kios Minta Bayar 1 Tahun (Rp 14,4 juta, +Rp 7,2 juta)

Tutup selisihnya dengan:

PENGHEMATAN	HEMAT
Kulkas showcase bekas yang kondisinya baik	± Rp 1,5 jt
Furniture bekas / bangku kayu panjang	± Rp 1,5 jt

PENGHEMATAN	HEMAT
Stok awal lebih kecil (belanja 2–3 hari sekali)	± Rp 1,5 jt
Tunda blender & set V60 ke bulan ke-2	± Rp 1,3 jt
Kurangi marketing awal, maksimalkan konten organik	± Rp 1 jt
Papan nama spanduk dulu, bukan papan permanen	± Rp 0,4 jt
Total	**± Rp 7,2 jt**

Dana cadangan **tetap Rp 8,7 juta**.

6.4 Opsi Tambahan Dana (opsional, nanti)

SUMBER	KAPAN COCOK	CATATAN
Laba usaha (utama)	Bulan 4+	Jalur paling aman untuk upgrade bertahap.
KUR Mikro (BRI, BNI, Mandiri, BSI, dll.)	Setelah usaha jalan ± 6 bulan	Bunga bersubsidi, plafon s.d. Rp 100 jt. Cocok untuk Tahap 3 (perluasan/cabang). Siapkan NIB, laporan penjualan POS, dan rekening usaha sebagai bukti.
Partner / investor kecil	Tahap 3	Wajib perjanjian tertulis: porsi modal, bagi hasil, pengelola, mekanisme keluar.
Pinjaman keluarga	Darurat	Tetap buat catatan tertulis & jadwal cicilan.

Hindari pinjol & paylater untuk modal usaha: bunga sangat tinggi dan bisa menghabiskan laba.

07

Proyeksi Keuangan

Asumsi, titik impas, skenario, dan proyeksi 12 bulan.

> Semua angka ini dihitung di `Model-Keuangan-Warkop.xlsx` . Ubah sel kuning (harga, gaji, sewa, target transaksi), hasil akan menyesuaikan.

7.1 Asumsi Utama

ASUMSI	NILAI
Rata-rata nilai transaksi	Rp 16.000
HPP rata-rata	42% dari omzet (konservatif; target operasional 38%)
Hari buka	30 hari/bulan
Pajak	PPh Final UMKM 0,5% (konservatif; lihat bab 13, kemungkinan besar Rp 0 di tahun pertama)
Pembayaran QRIS	50% transaksi, MDR 0,3%
Owner	Ikut bekerja, **tidak digaji dari biaya tetap**; penghasilan owner = laba bersih

7.2 Biaya Tetap Bulanan

BIAYA	PER BULAN
Sewa (Rp 1,2 jt/bulan)	1.200.000
Gaji 2 crew (contoh Rp 2,5 jt/orang)	5.000.000
Uang makan & bonus target	800.000
Listrik (2.200 VA, tanpa mesin espresso)	1.000.000
Gas LPG 12 kg	1.000.000
Air, galon & internet	600.000
Marketing rutin & konten	500.000
POS & aplikasi (versi gratis)	0
Kebersihan & perawatan alat	300.000
Lain-lain / tak terduga	400.000
Penyusutan alat (± Rp 20,4 jt ÷ 48 bulan)	450.000
TOTAL	**11.250.000**

> **Gaji:** Rp 2,5 jt adalah contoh. **Sesuaikan dengan UMK kabupaten/kotamu**, karena UMK antar daerah bisa berbeda lebih dari 2 kali lipat. Kalau UMK lebih tinggi, naikkan sel gaji di Excel dan lihat dampaknya ke BEP.

7.3 Titik Impas (BEP)

- **Omzet BEP ± Rp 19,6 juta/bulan ≈ Rp 654 ribu/hari ≈ 41 transaksi/hari.**
- Dengan buka 15 jam, cukup **± 3 transaksi per jam** untuk tidak rugi. Ini target yang realistis untuk lokasi yang ramai.

7.4 Tiga Skenario (kondisi stabil)

INDIKATOR	PESIMIS	MODERAT	OPTIMIS
Transaksi/hari	50	75	100
Rata-rata transaksi	Rp 15.000	Rp 16.000	Rp 17.000
Omzet/bulan	Rp 22,5 jt	**Rp 36,0 jt**	Rp 51,0 jt
HPP (42%)	Rp 9,5 jt	Rp 15,1 jt	Rp 21,4 jt
Laba kotor	Rp 13,1 jt	Rp 20,9 jt	Rp 29,6 jt
Biaya tetap	Rp 11,3 jt	Rp 11,3 jt	Rp 11,3 jt
Pajak + MDR	Rp 0,1 jt	Rp 0,2 jt	Rp 0,3 jt
Laba bersih/bulan (= penghasilan owner)	**Rp 1,7 jt**	**Rp 9,4 jt**	**Rp 18,0 jt**
Net margin	7,3%	26,1%	35,3%
Balik modal (kondisi stabil)	± 24 bulan	± 5 bulan	± 2,7 bulan

> Skenario pesimis adalah tanda bahaya: penghasilan owner hanya ± Rp 1,7 jt. Jika setelah 4–6 bulan masih di level ini, jalankan langkah perbaikan di bab 16.2.

7.5 Proyeksi 12 Bulan Pertama (skenario moderat dengan ramp-up)

BULAN	TRX/HARI	OMZET	LABA BERSIH	KAS KUMULATIF VS MODAL
1	40	19,2 jt	-0,2 jt	-48,6 jt
2	50	24,0 jt	2,5 jt	-44,4 jt
3	55	26,4 jt	3,9 jt	-38,9 jt
4	60	28,8 jt	5,3 jt	-32,0 jt
5	65	31,2 jt	6,6 jt	-23,7 jt
6	70	33,6 jt	8,0 jt	-14,0 jt
7	75	36,0 jt	9,4 jt	-4,2 jt
8	75	36,0 jt	9,4 jt	**+5,7 jt (balik modal)**

BULAN	TRX/HARI	OMZET	LABA BERSIH	KAS KUMULATIF VS MODAL
9	80	38,4 jt	10,8 jt	+16,9 jt
10	80	38,4 jt	10,8 jt	+28,1 jt
11	85	40,8 jt	12,1 jt	+40,7 jt
12	85	40,8 jt	12,1 jt	+53,3 jt
Total th-1		**Rp 393,6 jt**	**Rp 90,7 jt**	

Kas kumulatif = laba bersih + penyusutan (+ sewa pada bulan 1–6 yang sudah dibayar di muka), dikurangi modal Rp 50 juta. Proyeksi ini belum memasukkan upgrade Tahap 2; setelah mesin espresso, rata-rata transaksi diharapkan naik.

> **Penting:** sewa bulan 7–12 (Rp 7,2 juta) jatuh tempo di bulan ke-6. **Sisihkan Rp 1,2 juta/bulan ke rekening sewa** sejak bulan pertama.

7.6 Aturan Pengelolaan Uang (wajib disiplin)

1. **Pisahkan rekening**: rekening usaha ≠ rekening pribadi. QRIS masuk ke rekening usaha.
2. **Owner menggaji diri sendiri secara tetap**: bulan 1–3 maksimal Rp 1,5 jt/bulan (kalau perlu), bulan 4+ Rp 3–4 jt/bulan, sisanya tetap di usaha. Jangan ambil uang laci sesuka hati.
3. **Urutan pemakaian laba bersih bulanan:**
4. Sisihkan sewa periode berikutnya (Rp 1,2 jt/bulan).
5. Isi kembali dana cadangan sampai Rp 10 jt.
6. Gaji owner.
7. Sisa → dana upgrade Tahap 2 (freezer, mesin espresso).
8. **Setor tunai harian**: uang tunai di laci maksimal Rp 300 rb untuk kembalian, sisanya diamankan setiap tutup shift.
9. **Sisihkan THR** crew (1 bulan gaji ÷ 12 per crew) setiap bulan.

08

Sistem Operasional & SOP

Standar kerja harian supaya rasa dan uang konsisten.

8.1 Jam Operasional & Shift

SHIFT	JAM	ORANG	FOKUS
Siang	10.00–18.00	Crew A (barista/kasir + masak)	Ojol siang, mahasiswa, persiapan bahan sore
Malam	17.00–01.00 (Jum–Sab 02.00)	Crew B (masak) + **Owner** (kasir/barista)	Jam puncak; overlap 17.00–18.00 untuk serah terima
Owner	± 15.00–01.00 + belanja pagi	Owner	Belanja, kasir jam ramai, kontrol uang & kualitas

- Setiap crew kerja **6 hari/minggu, 1 hari libur bergilir**; di hari libur crew, owner + 1 part-timer (harian Rp 100–120 rb) menutup.
- Siang hari 1 crew cukup karena pesanan lebih sepi; cold brew & bahan sudah disiapkan sebelumnya.
- Tambah crew & jam pagi (06.00) di Tahap 2c, ketika rata-rata > 80 transaksi/hari.

8.2 SOP Buka Toko (Opening), ± 30 menit

1. Absen di grup WA (foto selfie di depan toko).
2. Nyalakan water boiler & rice cooker.
3. Cek kebersihan meja, lantai, wastafel.
4. Cek stok minimum (lihat par stock), catat yang kurang.
5. Hitung uang modal laci (Rp 300 rb) dan catat di POS.
6. Cek konsentrat cold brew (cukup? tanggal?), siapkan sirup gula aren.
7. Siapkan bahan: potong sayur, cabai, bawang goreng, es batu ke cool box.
8. Nyalakan musik, lampu papan nama, WiFi. Siap terima pelanggan.

8.3 SOP Pelayanan (target ≤ 7 menit makanan, ≤ 3 menit minuman)

1. Sapa: *"Selamat datang di [nama], Kak! Mau pesan apa?"*
2. Catat pesanan **langsung di POS** (tidak ada pesanan tanpa nota).
3. **Upsell 1 kali**: tawarkan minuman/paket/topping.
4. Bayar di depan (tunai/QRIS).
5. Antar pesanan, sebutkan nama menu.
6. Saat pelanggan pulang: *"Terima kasih, Kak, jangan lupa stempel kartunya!"*
7. Bersihkan meja maksimal 3 menit setelah pelanggan pergi.

8.4 SOP Kasir & Uang

- Semua transaksi masuk POS. **Tidak ada "ngebon"** tanpa persetujuan owner (jika ada, catat di POS sebagai piutang).
- Diskon/void hanya oleh owner.
- QRIS: cek notifikasi masuk sebelum pelanggan pergi (antisipasi bukti transfer palsu).
- Tutup shift: hitung uang fisik vs laporan POS, selisih > Rp 10 rb dicatat dan dijelaskan.

8.5 SOP Serah Terima Shift (17.00–18.00)

- ☐ Uang laci dihitung bersama & cocok dengan POS.
- ☐ Stok kritis (mie, telur, susu, cold brew, es, gas) dicek.
- ☐ Area bersih, piring & gelas tercuci.
- ☐ Catatan kejadian (alat rusak, komplain, pesanan khusus).

8.6 SOP Tutup Toko (Closing)

1. Last order 30 menit sebelum tutup.
2. Buat konsentrat cold brew untuk besok (jika stok < 1 hari).
3. Cuci semua alat, moka pot, blender; kosongkan sampah, pel lantai.
4. Simpan bahan di kulkas dengan label tanggal (FIFO).
5. Matikan kompor, **tutup regulator gas**, matikan alat (kecuali kulkas/CCTV).
6. Tutup kas: cetak/screenshot laporan POS, hitung uang, foto & kirim ke grup.
7. Kunci, foto pintu terkunci.

8.7 SOP Stok & Bahan

- **Par stock** (stok minimum), contoh: Indomie goreng min. 1 dus, telur min. 2 kg, susu UHT min. 6 L, kopi min. 1 kg, cold brew min. 1 botol, gas min. 1 tabung cadangan penuh.
- **Belanja harian** (sayur, cabai, roti, es batu) oleh owner pagi hari; **mingguan** (mie, susu, kopi, gula, kemasan).
- **Stok opname mingguan** (Minggu malam) untuk barang mahal: kopi, susu, keju, kornet, mie, telur. Bandingkan pemakaian vs penjualan POS, selisih > 3% diselidiki.
- FIFO + label tanggal; buang bahan kedaluwarsa dan catat sebagai "waste".

8.8 Standar Kebersihan & Keamanan Pangan

- Cuci tangan, rambut rapi/topi, apron, kuku pendek.
- Bahan mentah & matang dipisah; talenan dibedakan.
- Gelas & piring dicuci sabun + bilas air bersih + ditiriskan di rak.
- **Deep cleaning mingguan**: kulkas, kompor, saluran air, toples cold brew.
- Cek selang & regulator gas setiap minggu (tes air sabun).

09

SDM: Struktur, Gaji & Training

Tim ramping: owner turun tangan + 2 crew.

9.1 Struktur Awal (ramping)



9.2 Job Description

POSISI	TUGAS UTAMA	SKILL
Crew A (siang)	Kasir POS, buat minuman & makanan saat siang, persiapan bahan sore	Ramah, teliti uang, serba bisa
Crew B (malam)	Masak semua menu makanan saat jam ramai, kebersihan dapur, cuci alat	Cepat, bersih, tahan capek
Owner	Keuangan, belanja, HPP, marketing & konten, kasir/barista malam, rekrutmen	Disiplin & konsisten

9.3 Kompensasi

- Gaji pokok sesuai kemampuan & UMK setempat + **makan gratis 1–2 kali/shift**.
- **Bonus target bulanan** (contoh): omzet > Rp 35 jt → Rp 150 rb/crew; > Rp 45 jt → Rp 300 rb/crew.
- **Bonus selisih kas nol & kebersihan**: Rp 50–100 rb/bulan.
- THR 1 bulan gaji (wajib). Pertimbangkan **BPJS Ketenagakerjaan** (JKK & JKM iurannya terjangkau), terutama untuk risiko kecelakaan di dapur.
- Kenaikan gaji setelah 6 bulan bagi yang lolos evaluasi.

9.4 Rekrutmen

- Cari via: kenalan terpercaya, grup FB lowongan lokal, SMK tata boga, IG/TikTok warkop.
- Profil ideal: usia 18–30, jujur (cek referensi), mau belajar, tinggal dekat lokasi.

- **Tes praktik**: buat Indomie & es teh, lihat kebersihan & kecepatan.
- **Masa percobaan 1–3 bulan** dengan perjanjian kerja tertulis sederhana (gaji, jam kerja, aturan, sanksi).

9.5 Training (10 hari sebelum buka)

HARI	MATERI
1	Visi brand, standar pelayanan, aturan kerja, kebersihan & keamanan pangan
2–4	Semua resep minuman (cold brew, moka pot, V60, es kopi susu aren) & makanan sesuai kartu resep
5	POS & kasir: input pesanan, QRIS, tutup kas
6	SOP opening, closing, serah terima, stok
7–8	**Soft opening** untuk keluarga, teman & tetangga: simulasi jam ramai
9–10	Evaluasi & perbaikan

> Belajar barista dasar bisa dari video gratis + latihan dengan 1–2 kg kopi. Kursus barista berbayar ditunda sampai Tahap 2b (beli mesin espresso).

9.6 Aturan & Budaya Kerja

- Makan/minum di luar jatah harus dicatat.
- HP disimpan saat jam ramai.
- Tidak merokok di area bar & dapur.
- Evaluasi bulanan 1-on-1.
- Rayakan pencapaian (omzet rekor = makan bersama).

10

Teknologi & Kontrol Keuangan

Alat digital gratis dan aturan anti-kebocoran.

10.1 Perangkat Lunak (hampir semua gratis)

KEBUTUHAN	PILIHAN	BIAYA
POS (kasir, stok, laporan)	Aplikasi POS lokal untuk F&B yang punya **versi gratis** (contoh: Qasir, Pawoon, Moka, Majoo, Olsera; bandingkan dulu fiturnya) dipasang di HP owner + printer bluetooth	Rp 0 (versi gratis)
QRIS	Daftar via bank tempat rekening usaha; satu QR untuk semua e-wallet & m-banking	MDR kecil (usaha mikro ada tarif khusus; cek ke bank)
Ojol	GoFood (GoBiz), GrabFood (GrabMerchant), ShopeeFood	Komisi ± 20% + PPN; naikkan harga di aplikasi 15–25%
Pembukuan	Laporan POS + Google Sheets / buku kas	Gratis
Komunikasi	WhatsApp Business (katalog, label pelanggan, broadcast)	Gratis
Google Maps	Google Business Profile	Gratis
Desain	Canva (menu, poster promo, konten)	Gratis
CCTV	Aplikasi bawaan kamera WiFi di HP owner	Termasuk alat

10.2 Alur Laporan

FREKUENSI	LAPORAN	OLEH
Per shift	Omzet, jumlah nota, tunai vs QRIS, selisih kas, foto uang & laporan POS	Crew → grup WA owner
Harian	Belanja harian + nota, waste, kejadian penting	Owner
Mingguan	Stok opname, menu terlaris, HPP aktual vs target	Owner
Bulanan	Laba rugi, arus kas, KPI, evaluasi crew, rencana promo & upgrade	Owner

10.3 Kontrol Anti-Kebocoran

1. **Semua pesanan wajib lewat POS** dan dapur hanya masak berdasarkan struk ("no struk, no masak").
2. **Void & diskon hanya oleh owner.**
3. **Hitung stok barang mahal** vs penjualan: terjual 300 menu pakai telur, tapi telur keluar 380 butir? Ada masalah.
4. **CCTV mengarah ke kasir & laci.**
5. **Belanja pakai nota/foto.**
6. **Dorong QRIS** (uang tunai makin sedikit = risiko makin kecil).

7. **Sidak** hitung kas acak sesekali.

11

Supplier & Rantai Pasok

Bahan yang tepat, harga terjaga, stok tidak menumpuk.

11.1 Daftar Bahan & Sumber

BAHAN	SUMBER DISARANKAN	FREKUENSI	TIPS
Indomie & mie instan	Agen/grosir besar	Mingguan	Beli per dus, minta harga agen
Kopi sachet, teh, gula, SKM, krimer	Grosir sembako	Mingguan	Bandingkan 2–3 grosir
Kopi blend untuk cold brew/moka (robusta-arabika)	Roastery lokal	1–2 minggu	Minta sampel & harga langganan; ± Rp 100–150 rb/kg
Beans V60 (arabika lokal)	Roastery lokal	2 minggu	Cukup 1 varian, ganti tiap bulan untuk konten
Susu UHT	Grosir / distributor	2–3 hari	Cek tanggal kedaluwarsa
Telur	Agen telur	2–3 hari	Harga fluktuatif, pantau mingguan
Sayur, cabai, bawang	Pasar tradisional pagi	Harian	Cabai sering naik: siapkan sambal/cabai giling cadangan
Roti tawar	Toko/pabrik roti lokal	Harian	Minta antar pagi
Es batu kristal	Agen es	Harian	Pengganti freezer di Tahap 1
Gas LPG 12 kg	Agen resmi	Sesuai pemakaian	Selalu ada 1 tabung cadangan penuh
Kemasan (cup, tutup, sedotan, paper bowl)	Grosir kemasan / marketplace	2–4 minggu	Cup polos + stiker logo (lebih murah dari cup sablon)
Gorengan	**Titip jual** dari tetangga/UMKM sekitar	Harian	Tanpa modal & tanpa risiko sisa

11.2 Aturan Supplier

- Punya **minimal 2 supplier** untuk bahan kritis (mie, telur, susu, kopi, gas).
- Catat harga beli setiap bulan di sheet HPP.
- Negosiasi **tempo bayar 7 hari** setelah jadi pelanggan tetap (membantu arus kas).
- **Belanja secukupnya**: modal kecil tidak boleh "tidur" di gudang.

12

Marketing & Branding

Konten organik, komunitas, dan mulut ke mulut.

> Dengan budget kecil, kekuatan utama adalah **konten organik, komunitas sekitar, dan mulut ke mulut**.

12.1 Pra-Launch (H-21 s.d. H-1), budget ± Rp 600 rb

- Buat akun **Instagram, TikTok, WhatsApp Business, Google Business Profile** dengan nama yang sama.
- Konten "behind the scenes" renovasi: *"Bikin warkop rasa kafe modal 50 juta, hari ke-1..."* (cerita modal kecil sering menarik penonton).
- Pasang **spanduk "Segera Buka"** + tanggal grand opening di depan lokasi.
- Bagikan **voucher gratis es kopi susu** (± 150 lembar, dicetak sendiri) ke ojol di pangkalan sekitar, kampus, pabrik, kos-kosan.
- Ajak **akun info daerah / kreator lokal** datang saat soft opening (barter makan-minum gratis).

12.2 Grand Opening (3 hari), budget ± Rp 1,4 jt

- **Promo "Rp 5.000 es kopi susu aren"** untuk 50 pembeli pertama per hari, atau **beli 1 gratis 1** jam 16.00–19.00.
- Gratis 1 gorengan untuk yang follow IG + tag 2 teman.
- Musik akustik dari teman/musisi lokal (barter makan-minum).
- **Kartu stamp** dibagikan sejak hari pertama.
- Target: **minimal 200 orang pernah mencoba** dalam 3 hari dan 300 follower IG.

12.3 Program Rutin (murah/gratis)

PROGRAM	MEKANISME	TUJUAN
Kartu stamp	Beli 10 minuman → gratis 1 es kopi susu aren (stamp fisik)	Pelanggan balik lagi
Happy Hour Ojol	11.00–14.00: tunjukkan jaket/aplikasi ojol, kopi sachet Rp 4.000	Isi jam sepi
Jumat Berkah	Nasi telor gratis untuk 10 ojol pertama	Citra baik, viral lokal
Mabar / turnamen game	Turnamen Mobile Legends/eFootball bulanan, hadiah voucher makan	Komunitas anak muda
Nobar (Tahap 2a, setelah ada TV)	Paket rombongan	Ramai malam
Menu musiman	Ganti tiap 2–3 bulan	Alasan datang lagi + konten

PROGRAM	MEKANISME	TUJUAN
Broadcast WA	Info promo & menu baru ke pelanggan yang menyimpan nomor	Retensi gratis

12.4 Strategi Konten Digital (minimal 4 post/minggu, direkam pakai HP)

PILAR KONTEN	CONTOH	PORSI
Menu & proses	Close-up Indomie special, layer es kopi susu aren, proses cold brew	40%
Suasana & pelanggan	Malam ramai, mabar, testimoni pelanggan	25%
Cerita owner	Perjalanan bangun warkop modal 50 juta, belanja ke pasar subuh, target upgrade mesin espresso	20%
Promo & info	Promo minggu ini, menu baru, jam buka	15%

- **Video pendek 15–30 detik** di TikTok & Reels.
- Posting jam **11.00–13.00 dan 18.00–21.00**.
- Balas semua komentar & DM < 1 jam.
- Iklan berbayar hanya saat promo/menu baru: **radius 3 km, Rp 20–30 rb/hari selama 5–7 hari**.

12.5 Google Maps & Review

- Lengkapi profil: foto menu, jam buka, nomor WA, link GoFood.
- QR code "Review kami di Google" di meja. Target **50 review bintang ≥ 4,7** dalam 6 bulan.
- Balas setiap review, terutama yang negatif: minta maaf, jelaskan perbaikan.

12.6 Ojol (GoFood / GrabFood / ShopeeFood)

- Daftar setelah operasional stabil (± minggu ke-3).
- Harga di aplikasi **+15–25%** untuk menutup komisi.
- Menu ojol 8–12 item yang tahan perjalanan (mie goreng > mie rebus; es kopi susu aren cocok).
- Foto menu sendiri dengan HP: cahaya siang dari jendela, latar polos.
- Ikut promo platform secara selektif, hitung dulu margin setelah komisi & diskon.

12.7 Budget Marketing

PERIODE	BUDGET	ALOKASI
Pra-launch & grand opening	Rp 2 jt	Voucher & promo 50%, spanduk/cetak 25%, iklan digital 25%
Rutin per bulan	Rp 500 rb	Iklan digital saat promo 50%, hadiah event/komunitas 30%, cetak 20%

13

Legal & Perizinan

Izin dan pajak yang perlu diurus.

IZIN / DOKUMEN	INSTANSI	BIAYA	KETERANGAN
NIB (Nomor Induk Berusaha)	OSS (oss.go.id)	Gratis	Wajib. Pilih KBLI rumah makan / kedai minuman yang sesuai. Untuk usaha mikro risiko rendah, NIB sudah berlaku sebagai izin usaha. NIB juga syarat KUR nanti.
NPWP pribadi	DJP	Gratis	Untuk pajak & syarat pinjaman bank.
Sertifikat Halal	BPJPH (SIHALAL)	Jalur **self-declare** untuk UMK (sering ada kuota gratis)	**Kewajiban sertifikasi halal bagi UMK makanan & minuman berlaku mulai Oktober 2026**, jadi urus sejak persiapan. Pastikan bahan (kornet, keju, sirup, dll.) berlabel halal.
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)	Dinas Kesehatan / Puskesmas	Bervariasi	Persyaratan bisa berbeda per daerah; tanyakan ke Dinkes. Bisa diurus setelah buka jika belum diwajibkan untuk skala usahamu.
Izin lingkungan RT/RW & surat domisili	RT/RW, kelurahan	Bervariasi	Penting karena buka malam.
Pajak daerah (PBJT makanan & minuman)	Bapenda kab/kota	Maks. 10% dari penjualan, **hanya jika omzet di atas batas yang ditetapkan Perda**	Banyak daerah membebaskan usaha dengan omzet kecil. Tanyakan ambang batas di daerahmu.
PPh Final UMKM 0,5%	DJP	0,5% omzet	Wajib pajak orang pribadi: **omzet sampai Rp 500 jt/tahun tidak dikenai PPh**. Proyeksi omzet tahun pertama ± Rp 394 jt, jadi kemungkinan besar Rp 0. Tetap lapor SPT tahunan. Cek ketentuan terbaru di DJP.
Pendaftaran merek	DJKI	Tarif UMKM	Tahap 2, setelah nama terbukti cocok.
Perjanjian sewa	Di bawah tangan + materai	± Rp 0	Wajib tertulis.
Perjanjian kerja crew	Internal	Gratis	Gaji, jam kerja, aturan, sanksi, masa percobaan.

> Aturan perizinan & pajak bisa berubah dan berbeda antar daerah. Cek langsung ke OSS, BPJPH, Dinkes, dan Bapenda setempat.

14

Manajemen Risiko

Apa yang bisa salah dan cara mencegahnya.

RISIKO	DAMPAK	PENCEGAHAN / MITIGASI
Lokasi sepi / salah lokasi	Sangat tinggi	Validasi lokasi (bab 2); sewa per 6 bulan supaya bisa pindah tanpa rugi besar; alat mudah dibawa
Kehabisan modal di bulan awal	Tinggi	Dana cadangan Rp 8,7 jt, owner tidak ambil uang sebelum bulan 3, tidak membeli alat tambahan sebelum BEP
Owner kelelahan (kerja 10+ jam/hari)	Tinggi	1 hari libur/minggu dengan part-timer, tambah crew saat > 80 transaksi/hari
Kebocoran kas & stok	Tinggi	POS, "no struk no masak", stok opname, CCTV, QRIS, owner hadir di jam ramai
Kualitas tidak konsisten	Tinggi	Kartu resep, timbangan, cold brew dibuat dengan takaran tetap
Harga bahan naik	Sedang	Update HPP bulanan, 2 supplier, sesuaikan harga/porsi
Crew keluar mendadak	Sedang	Part-timer cadangan, SOP tertulis, owner bisa semua posisi
Pemilik kios tidak memperpanjang	Sedang	Hak perpanjangan di kontrak; bangun pelanggan via IG/WA supaya bisa ikut pindah
Kompetitor meniru / perang harga	Sedang	Bersaing di pengalaman & komunitas, bukan harga termurah
Keluhan warga (bising, parkir, sampah)	Sedang	Izin RT/RW, volume musik kecil setelah 23.00, atur parkir, kebersihan
Kebakaran / kebocoran gas	Sangat tinggi	APAR, cek selang & regulator mingguan, instalasi listrik oleh tukang
Alat rusak	Sedang	Garansi alat baru, kontak teknisi, dana cadangan
Keamanan malam	Sedang	CCTV, lampu terang, uang tunai minimal

15

Timeline Eksekusi

Langkah demi langkah dari H-60 sampai H+90.

Fase 1: Validasi & Lokasi (H-60 s.d. H-41)

- [ ] Finalisasi konsep, nama, dan target pasar.
- [ ] Survei 3–5 kandidat lokasi + skoring.
- [ ] Riset kompetitor & wawancara calon pelanggan.
- [ ] Hitung ulang model keuangan dengan harga lokal.
- [ ] Negosiasi & tanda tangan kontrak sewa (target bayar per 6 bulan).

Fase 2: Legal, Brand & Renovasi (H-40 s.d. H-15)

- [ ] Urus NIB, izin RT/RW, mulai proses halal self-declare.
- [ ] Buat logo (Canva/freelancer) & akun media sosial; mulai konten "dari nol".
- [ ] Renovasi ringan: listrik & plumbing (tukang), cat & mural (DIY).
- [ ] Pesan furniture & papan nama.
- [ ] Beli peralatan (cek bekas untuk furniture).
- [ ] Pilih supplier; minta sampel kopi dari 2–3 roastery, uji resep cold brew.
- [ ] Rekrutmen 2 crew + 1 part-timer.
- [ ] Pasang spanduk "Segera Buka".

Fase 3: Training & Soft Opening (H-14 s.d. H-1)

- [ ] Finalisasi menu, kartu resep, dan HPP.
- [ ] Training crew 10 hari (bab 9.5).
- [ ] Setting POS di HP: menu, harga, akun crew.
- [ ] Daftar QRIS & Google Business Profile.
- [ ] Belanja stok awal.
- [ ] **Soft opening 2 hari** (keluarga, teman, tetangga), kumpulkan masukan.
- [ ] Sebar voucher ke ojol, kampus, pabrik, kos.

Fase 4: Grand Opening & Stabilisasi (H s.d. H+30)

- [ ] Grand opening 3 hari dengan promo.
- [ ] Evaluasi harian: kecepatan, rasa, komplain, menu yang tidak laku.
- [ ] Daftar GoFood/GrabFood/ShopeeFood (minggu ke-3).
- [ ] Konten rutin 4 post/minggu.

Fase 5: Optimasi (H+31 s.d. H+90)

- [ ] Analisis menu dari data POS.
- [ ] Jalankan program rutin: happy hour ojol, mabar, Jumat berkah.
- [ ] Kejar 50 review Google.
- [ ] Evaluasi crew bulan ke-1 & ke-2.
- [ ] Cek: sudah > 41 transaksi/hari (BEP)? Jika belum, lihat bab 16.2.
- [ ] Mulai menabung untuk Tahap 2a (freezer, TV, neon box).

16

KPI & Dashboard

Angka yang dipantau setiap minggu.

16.1 KPI Utama

KPI	TARGET	CARA UKUR
Transaksi per hari	≥ 41 (BEP) bulan 1–2; ≥ 75 bulan 7+	POS
Rata-rata nilai transaksi	≥ Rp 16.000 (≥ Rp 18.000 setelah ada espresso)	POS
HPP aktual	≤ 42% (target 38%)	Belanja ÷ omzet + stok opname
Biaya tenaga kerja crew	≤ 20% omzet	Gaji ÷ omzet
Waste bahan	≤ 2% omzet	Catatan waste
Selisih kas	Rp 0 (toleransi ± Rp 10 rb/shift)	Laporan tutup kas
Waktu saji	Minuman ≤ 3 menit, makanan ≤ 7 menit	Sampling stopwatch mingguan
Rating Google Maps	≥ 4,7	Google Business Profile
Repeat customer	≥ 40% transaksi	Kartu stamp
Porsi QRIS	≥ 50% transaksi	POS
Follower IG/TikTok	+200/bulan	Insight medsos
Dana cadangan	Selalu ≥ Rp 8 jt	Saldo rekening cadangan

16.2 Jika Penjualan di Bawah Target

1. **Cek traffic**: apakah orang tahu kita ada? → spanduk lebih besar, voucher, iklan radius dekat.
2. **Cek konversi**: banyak yang lewat tapi tidak mampir? → tampilan depan lebih terang, menu board besar dengan harga jelas di depan.
3. **Cek retensi**: sudah coba tapi tidak balik? → tanya alasan, perbaiki rasa/kecepatan/kebersihan, aktifkan kartu stamp.
4. **Cek jam**: jam mana yang sepi? → promo khusus jam itu, atau kurangi jam buka untuk hemat biaya.
5. Jika setelah **6 bulan** (akhir kontrak sewa pertama) masih di bawah BEP dengan semua upaya di atas → **pindah lokasi** saat kontrak habis (alat dibawa; kerugian utama hanya renovasi ringan ± Rp 5 jt).

17

Roadmap 3 Tahun

Dari satu kios kecil ke konsep penuh.

PERIODE	FOKUS	TARGET
Bulan 1–3	Bertahan	Tembus BEP (41 trx/hari), SOP berjalan, pelanggan tetap mulai terbentuk
Bulan 4–6	Stabil + Tahap 2a	65–70 trx/hari; beli freezer, TV bekas, neon box dari laba
Bulan 7–9	Naik kelas + Tahap 2b	Balik modal (± bulan 8); **beli mesin espresso**, tambah menu espresso
Bulan 10–12	Tahap 2c	Tambah crew, buka pagi, rata-rata transaksi ≥ Rp 18 rb, omzet ≥ Rp 45 jt/bulan
Tahun 2	Konsep penuh	Ajukan KUR (usaha sudah ≥ 6 bulan, ada NIB & laporan POS); pindah/perluas ke ruko 4 × 10 m dengan 36–40 kursi, atau buka cabang ke-2 di lokasi lain; daftar merek
Tahun 3	Sistem & skala	2–3 outlet, dapur pusat untuk cold brew & sirup, produk kopi literan/botolan, pertimbangkan kemitraan setelah 3 outlet terbukti profit (butuh STPW & prospektus sesuai aturan waralaba)

Diversifikasi pendapatan (tanpa modal besar):

- **Kopi susu literan (1 L)** dari cold brew: cocok untuk kantor, arisan, acara keluarga.
- Catering kopi & snack untuk acara (rapat RT, pengajian, kantor kecil).
- Sewa tempat untuk acara komunitas dengan minimum order.

18

Checklist Sebelum Buka

Pastikan semua siap sebelum pintu dibuka.

Tempat

- ☐ Renovasi selesai, instalasi listrik aman (dikerjakan tukang)
- ☐ Papan nama terpasang & terlihat dari jalan, lampu menyala malam
- ☐ Colokan di meja bar berfungsi, WiFi stabil
- ☐ Wastafel bersih, sabun & tisu tersedia
- ☐ APAR terpasang, crew tahu cara pakai

Alat & Bahan

- ☐ Semua alat diuji (moka pot, grinder, blender, kompor, kulkas, plat pemanggang, printer)
- ☐ Konsentrat cold brew batch pertama siap
- ☐ Stok bahan awal sesuai par stock
- ☐ Kartu resep tertempel di bar & dapur

Sistem

- ☐ POS di HP siap: menu, harga, akun crew
- ☐ QRIS aktif & sudah dites
- ☐ CCTV merekam & bisa dipantau dari HP
- ☐ Grup WA laporan & template laporan siap
- ☐ Rekening usaha, rekening sewa, dan rekening cadangan terpisah

SDM

- ☐ 2 crew + 1 part-timer siap, perjanjian kerja ditandatangani
- ☐ Training selesai, soft opening sukses
- ☐ Jadwal shift & hari libur bulan pertama dibuat

Legal

- ☐ NIB terbit, izin RT/RW, proses halal berjalan/selesai
- ☐ Kontrak sewa ditandatangani

Marketing

- ☐ IG, TikTok, WA Business, Google Maps aktif
- ☐ Voucher tersebar, promo grand opening siap, kartu stamp dicetak

19

Lampiran: Template Laporan

Format laporan siap pakai.

19.1 Laporan Tutup Shift (kirim ke grup WA)

```
LAPORAN SHIFT [SIANG/MALAM]  —  [Tanggal]
Crew         : ...
-----------------------------------
Jumlah nota  : ...
Omzet total  : Rp ...

  - Tunai    : Rp ...
  - QRIS     : Rp ...
  - Ojol     : Rp ...
Modal laci   : Rp 300.000
Uang fisik   : Rp ...
Selisih      : Rp ... (alasan: ...)
-----------------------------------
Belanja shift: Rp ... (foto nota terlampir)
Waste        : ... (item & alasan)
Stok kritis  : mie / telur / susu / cold brew / gas / es  → aman / kurang
Kejadian     : (komplain, alat rusak, dll.)
[Foto laporan POS + foto uang]
```

19.2 Laba Rugi Bulanan Sederhana

```
OMZET                                  Rp ........
(-) HPP (belanja bahan ± perubahan stok) Rp ........
= LABA KOTOR                           Rp ........
(-) Gaji crew + makan + bonus          Rp ........
(-) Sewa                               Rp ........
(-) Listrik, gas, air, internet        Rp ........
(-) Marketing                          Rp ........
(-) Perawatan & lain-lain              Rp ........
(-) Penyusutan alat                    Rp ........
(-) Pajak & biaya QRIS/ojol            Rp ........
= LABA BERSIH                          Rp ........
Urutan pakai: 1) tabungan sewa  2) isi cadangan  3) gaji owner  4) dana upgrade
```

19.3 Stok Opname Mingguan

BAHAN	STOK AWAL	MASUK	STOK AKHIR (HITUNG FISIK)	TERPAKAI	SEHARUSNYA (DARI POS)	SELISIH %
Indomie goreng (bungkus)						
Telur (butir)						
Kopi blend (g)						
Susu UHT (ml)						

BAHAN	STOK AWAL	MASUK	STOK AKHIR (HITUNG FISIK)	TERPAKAI	SEHARUSNYA (DARI POS)	SELISIH %
Keju (g)						
Kornet (g)						

Penutup

Modal Rp 50 juta **cukup** untuk memulai warkop naik kelas, asalkan disiplin pada tiga hal: **lokasi yang tepat, owner turun tangan langsung, dan upgrade hanya dari laba**. Warkop yang bertahan lama bukan yang paling mewah, tapi yang **paling konsisten**: rasa sama, cepat, bersih, ramah, dan uangnya tercatat rapi.

Langkah berikutnya:

1. Buka `Model-Keuangan-Warkop.xlsx` dan ganti angka di sel kuning dengan harga di daerahmu.
2. Survei 3–5 lokasi minggu ini dengan formulir skor di bab 2.3.
3. Mulai timeline H-60.

Semoga lancar dan laris! ☕🍜
